







































ID	Re úk	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci														
							25.IX 17	2.X 17	9.X 17	16.X 17	23.X 17	30.X 17	6.XI 17	13.XI 17	20.XI 17	27.XI 17	4.XII 17	11.XII 17	18.XII 17	
1		SO: Stavební úpravy v areálu národní kulturní památky Kostela sv. Bartoloměje	130 týdny	2.10. 17	27.3. 20															
2		STAVBA:																		
3																				
4		Stavebně-historický průzkum	130 týdn	2.10. 17	27.3. 20															
5																				
6		1_SO-01: Zvonice																		
7		Zemní práce	1 týden	2.10. 17	6.10. 17															
8		Bourané konstrukce	2 týdny	9.10. 17	20.10. 17	7														
9		Nové konstrukce	4 týdny	6.11. 17	1.12. 17	10														
10		Sanace	2 týdny	23.10. 17	3.11. 17	8														
11		Restaurování/repase výplní otvorů	10 týdny	23.10. 17	29.12. 17	8														
12		Kamenické prvky	4 týdny	18.12. 17	12.1. 18	14														
13		Zámečnické a kovářské prvky	6 týdny	18.12. 17	26.1. 18	14														
14		Truhlářské prvky	2 týdny	4.12. 17	15.12. 17	9														
15		Klempířské prvky	1 týden	18.12. 17	22.12. 17	14														
16		Odstraňování prvků	2 týdny	9.10. 17	20.10. 17	7														
17		Restaurátorské práce	16 týdny	23.10. 17	9.2. 18	8														
18		Rekonstrukce elektrorozvodny	16 týdny	1.3. 18	20.6. 18															
19		Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 týden	21.6. 18	27.6. 18	18														
20		Zařízení slaboproudé elektrotechniky	1 týden	21.6. 18	27.6. 18	18														
21																				
22		2_SO-02: Stará škola																		
23		Zemní práce	1 týden	3.10. 17	9.10. 17															
24		Bourané konstrukce	2 týdny	10.10. 17	23.10. 17	23														
25		Nové konstrukce	4 týdny	31.7. 18	27.8. 18	26														
26		Sanace	40 týdny	24.10. 17	30.7. 18	24														
27		Kamenické prvky	2 týdny	25.9. 18	8.10. 18	28														
28		Truhlářské prvky	4 týdny	28.8. 18	24.9. 18	25														
29		Klempířské prvky	1 týden	18.12. 17	22.12. 17	14														
30		Odstraňování prvků	1 týden	10.10. 17	16.10. 17	23														
31		Restaurování a repase výplní otvorů	10 týdny	24.10. 17	1.1. 18	24														
32		Zařízení silnoproudé elektrotechniky	1 týden	28.6. 18	4.7. 18	20														
33		Zařízení slaboproudé elektrotechniky	1 týden	28.6. 18	4.7. 18	20														
34																				
35		3_SO-03: Kostnice																		
36		Bourané konstrukce	8 týdny	1.4. 18	24.5. 18															

Projekt: Projekt8 Datum: 14.9. 17	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

Stránka 1

ID	Re úk	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci												
							25.IX 17	2.X 17	9.X 17	16.X 17	23.X 17	30.X 17	6.XI 17	13.XI 17	20.XI 17	27.XI 17	4.XII 17	11.XII 17
37		Nové konstrukce	1 týden	3.8. 18	9.8. 18	38												
38		Sanace	10 týdny	25.5. 18	2.8. 18	36												
39		Truhlářské prvky	10 týdny	10.8. 18	18.10. 18	37												
40		Klempířské prvky	1 týden	19.10. 18	25.10. 18	39												
41		Ostatní prvky	1 týden	19.10. 18	25.10. 18	39												
42		Restaurátorské práce	96 týdny	25.5. 18	26.3. 20	36												
43		Ostatní	96 týdny	25.5. 18	26.3. 20	36												
44		Zařízení silnoproudé elektrotechniky	2 týdny	5.7. 18	18.7. 18	33												
45		Zařízení slaboproudé elektrotechniky	2 týdny	5.7. 18	18.7. 18	33												
46																		
47		4_SO-04: Hradební zeď																
48		Bourané konstrukce	8 týdny	1.4. 19	24.5. 19													
49		Sanace	12 týdny	27.5. 19	16.8. 19	48												
50		Kamenické prvky	16 týdny	19.8. 19	6.12. 19	49												
51		Zámečnické a kovářské prvky	8 týdny	9.12. 19	31.1. 20	50												
52		Restaurátorské práce	16 týdny	27.5. 19	13.9. 19	48												
53		Ostatní	12 týdny	27.5. 19	16.8. 19	48												
54																		
55		5_SO-05: Parter																
56		Zemní práce	16 týdny	1.4. 19	19.7. 19													
57		Bourané konstrukce	1 týden	22.7. 19	26.7. 19	56												
58		Sanace	16 týdny	29.7. 19	15.11. 19	57												
59		Dveře	10 týdny	29.7. 19	4.10. 19	57												
60		Restaurátorské práce	20 týdny	18.11. 19	3.4. 20	58												
61		Ostatní	20 týdny	18.11. 19	3.4. 20	58												
62		Vnitroareálové rozvody silnoproudu	4 týdny	29.7. 19	23.8. 19	57												
63		Vnitroareálové rozvody slaboproudu	4 týdny	29.7. 19	23.8. 19	57												
64		Sadové úpravy	10 týdny	1.9. 19	7.11. 19													
65																		
66		6_IO: Inženýrské objekty																
67		Přípojka vody	8 týdny	18.11. 19	10.1. 20	58												
68		Přípojka kanalizace	8 týdny	18.11. 19	10.1. 20	58												
69		Přípojka slaboproudu	8 týdny	18.11. 19	10.1. 20	58												
70		Nasvětlení vnějších fasád	2 týdny	1.2. 20	13.2. 20													
71		Přípojka NN	8 týdny	18.11. 19	10.1. 20	58												
72		Veřejné osvětlení	4 týdny	18.11. 19	13.12. 19	58												
73																		
74		PARKÁN:																

Projekt: Projekt8 Datum: 14.9. 17	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

ID	Re úk	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Předchůdci												
							25.IX 17	2.X 17	9.X 17	16.X 17	23.X 17	30.X 17	6.XI 17	13.XI 17	20.XI 17	27.XI 17	4.XII 17	11.XII 17
75		SO-01 Parkán																
76		Terénní úpravy	2 týdny	1.4. 19	12.4. 19													
77		Sadební úpravy	16 týdny	1.9. 19	19.12. 19													
78		Sanace zdí, zídek a schodišť	10 týdny	29.7. 19	4.10. 19	57												
79		Zahradní domek	24 týdny	1.4. 19	13.9. 19													
80		Silnoproud	2 týdny	16.9. 19	27.9. 19	79												
81		Slaboproud	2 týdny	16.9. 19	27.9. 19	79												
82		Chodníky	2 týdny	1.9. 19	12.9. 19													
83																		
84		SO-02 Suterén muzea																
85		Bourání kci	2 týdny	13.9. 19	26.9. 19	82												
86		Sanace kci	8 týdny	27.9. 19	21.11. 19	85												
87		Podlahy	4 týdny	22.11. 19	19.12. 19	86												
88		Zdravotně technické instalace	8 týdny	20.12. 19	13.2. 20	87												
89		Výplně otvorů	8 týdny	27.9. 19	21.11. 19	85												
90		Dokončovací práce	8 týdny	17.1. 20	12.3. 20	91												
91		Restaurátorské práce	8 týdny	22.11. 19	16.1. 20	86												

Projekt: Projekt8
Datum: 14.9. 17

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh

[illegible]

18.XII 17	25.XII 17	1.I 18	8.I 18	15.I 18	22.I 18	29.I 18	5.II 18	12.II 18	19.II 18	26.II 18	5.III 18	12.III 18	19.III 18	26.III 18	2.IV 18	9.IV 18	16.IV 18	23.IV 18	30.IV 18
-----------	-----------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------	----------

Projekt: Projekt8
Datum: 14.9. 17

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly



Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání



Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení



















Konečný termín

Průběh




18.XII 17	25.XII 17	1.I 18	8.I 18	15.I 18	22.I 18	29.I 18	5.II 18	12.II 18	19.II 18	26.II 18	5.III 18	12.III 18	19.III 18	26.III 18	2.IV 18	9.IV 18	16.IV 18	23.IV 18	30.IV 18
-----------	-----------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	----------	----------	----------

Projekt: Projekt8
Datum: 14.9. 17

Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

7.V 18	14.V 18	21.V 18	28.V 18	4.VI 18	11.VI 18	18.VI 18	25.VI 18	2.VII 18	9.VII 18	16.VII 18	23.VII 18	30.VII 18	6.VIII 18	13.VIII 18	20.VIII 18	27.VIII 18	3.IX 18	10.IX 18	17.IX 18
--------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	---------	----------	----------

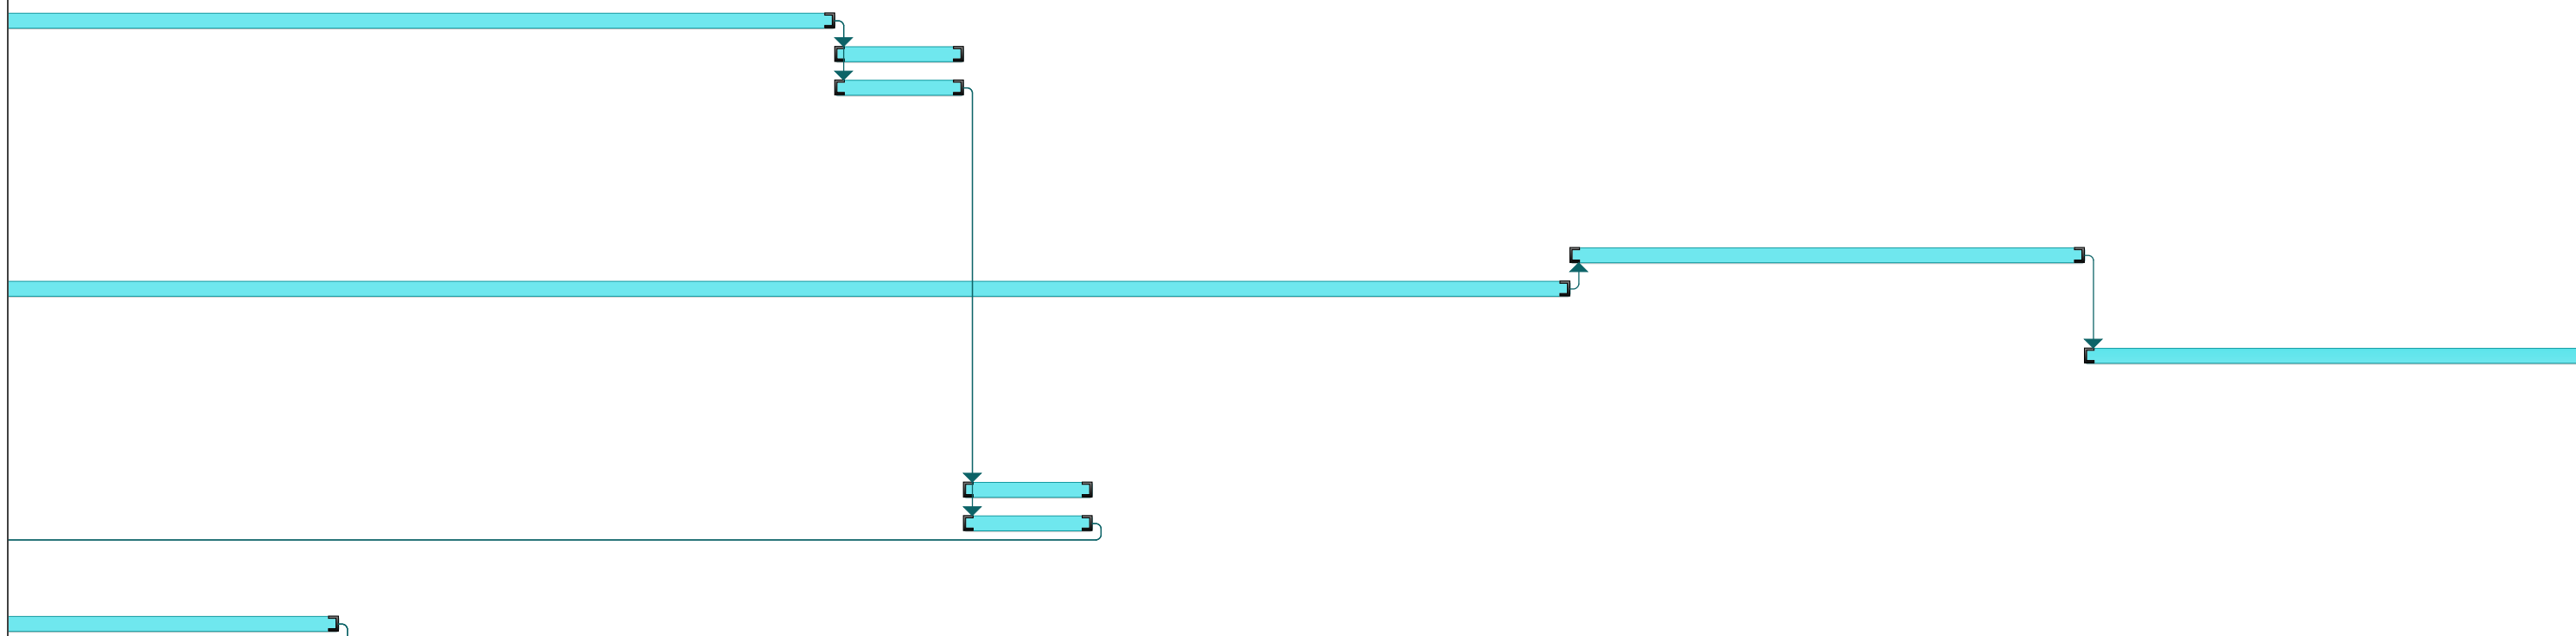

Projekt: Projekt8 Datum: 14.9. 17	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

7.V 18

14.V 18

21.V 18

28.V 18

4.VI 18

11.VI 18

18.VI 18

25.VI 18

2.VII 18

9.VII 18

16.VII 18

23.VII 18

30.VII 18

6.VIII 18

13.VIII 18

20.VIII 18

27.VIII 18

3.IX 18

10.IX 18

17.IX 18

Projekt: Projekt8

Datum: 14.9. 17

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení



Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh



















Stránka 9

24.IX 18	1.X 18	8.X 18	15.X 18	22.X 18	29.X 18	5.XI 18	12.XI 18	19.XI 18	26.XI 18	3.XII 18	10.XII 18	17.XII 18	24.XII 18	31.XII 18	7.I 19	14.I 19	21.I 19	28.I 19	4.II 19
----------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------



Projekt: Projekt8 Datum: 14.9. 17	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

24.IX 18	1.X 18	8.X 18	15.X 18	22.X 18	29.X 18	5.XI 18	12.XI 18	19.XI 18	26.XI 18	3.XII 18	10.XII 18	17.XII 18	24.XII 18	31.XII 18	7.I 19	14.I 19	21.I 19	28.I 19	4.II 19
----------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

Projekt: Projekt8 Datum: 14.9. 17	Úkol		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Ruční souhrn	
	Milník		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Konečný termín	
	Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Průběh	

11.II 19

18.II 19

25.II 19

4.III 19

11.III 19

18.III 19

25.III 19

1.IV 19

8.IV 19

15.IV 19

22.IV 19

29.IV 19

6.V 19

13.V 19

20.V 19

27.V 19

3.VI 19

10.VI 19

17.VI 19

24.VI 19

Projekt: Projekt8

Datum: 14.9. 17

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn


Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení


Konečný termín

Průběh

Stránka 13

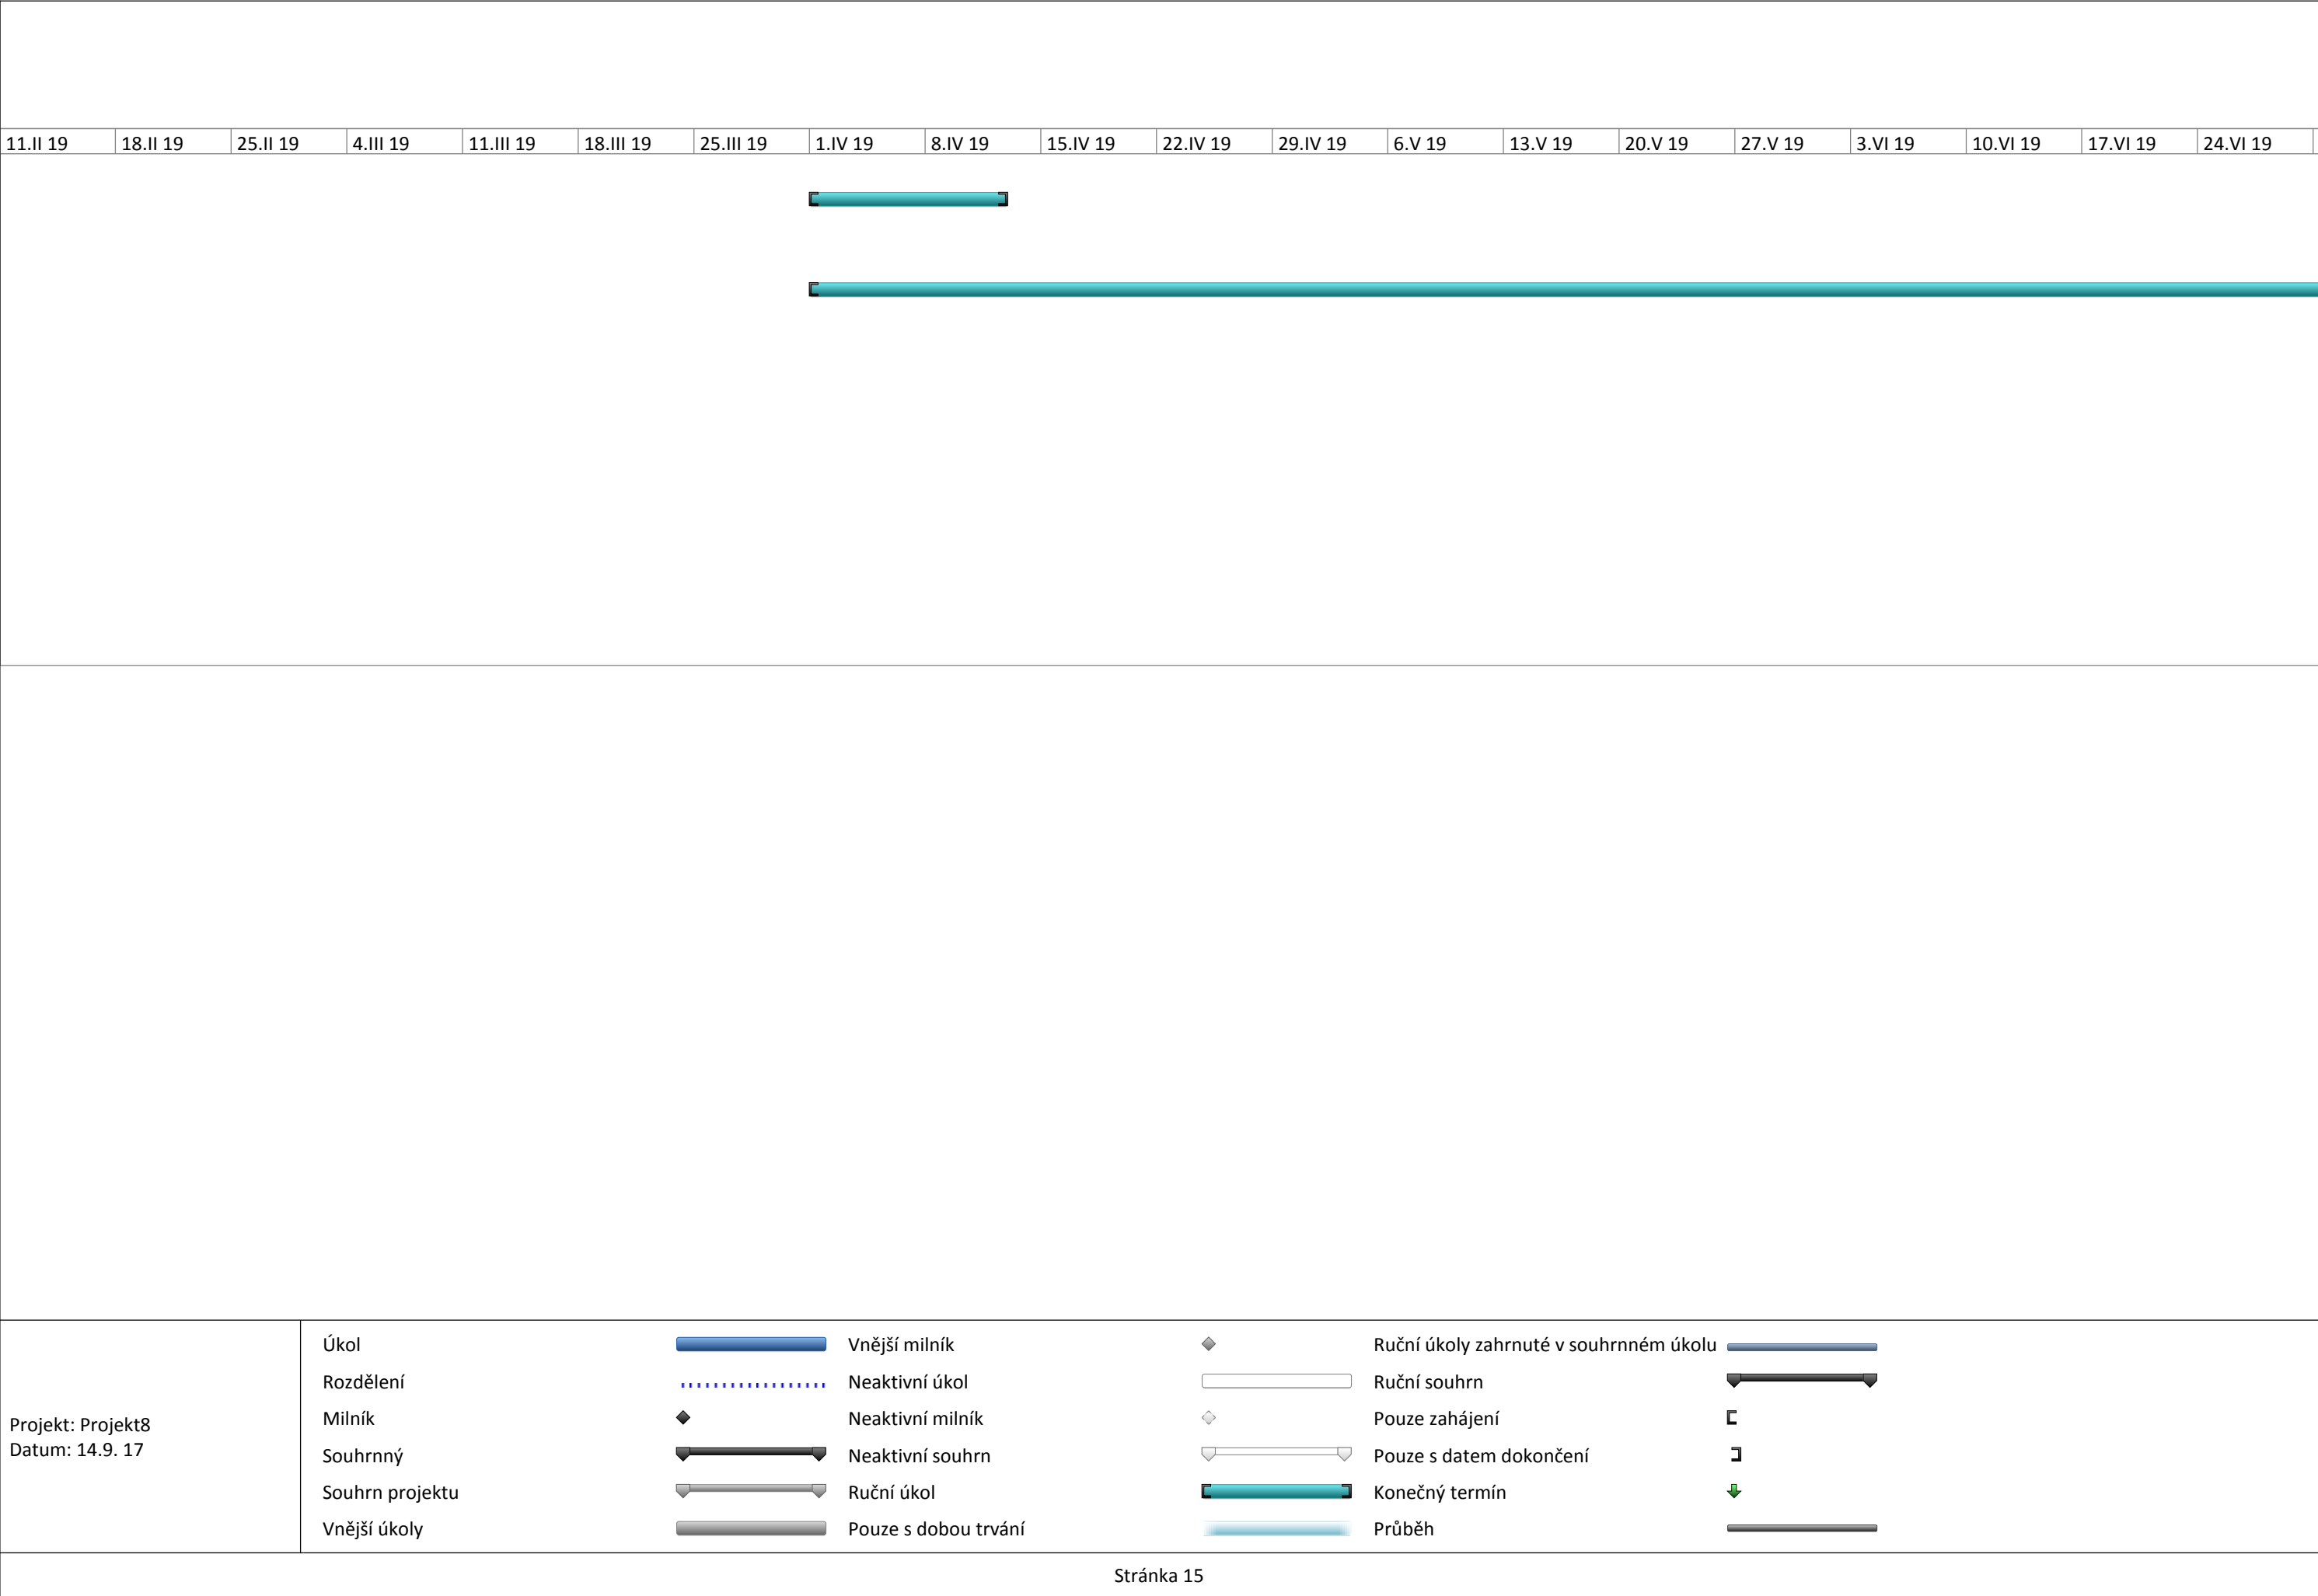



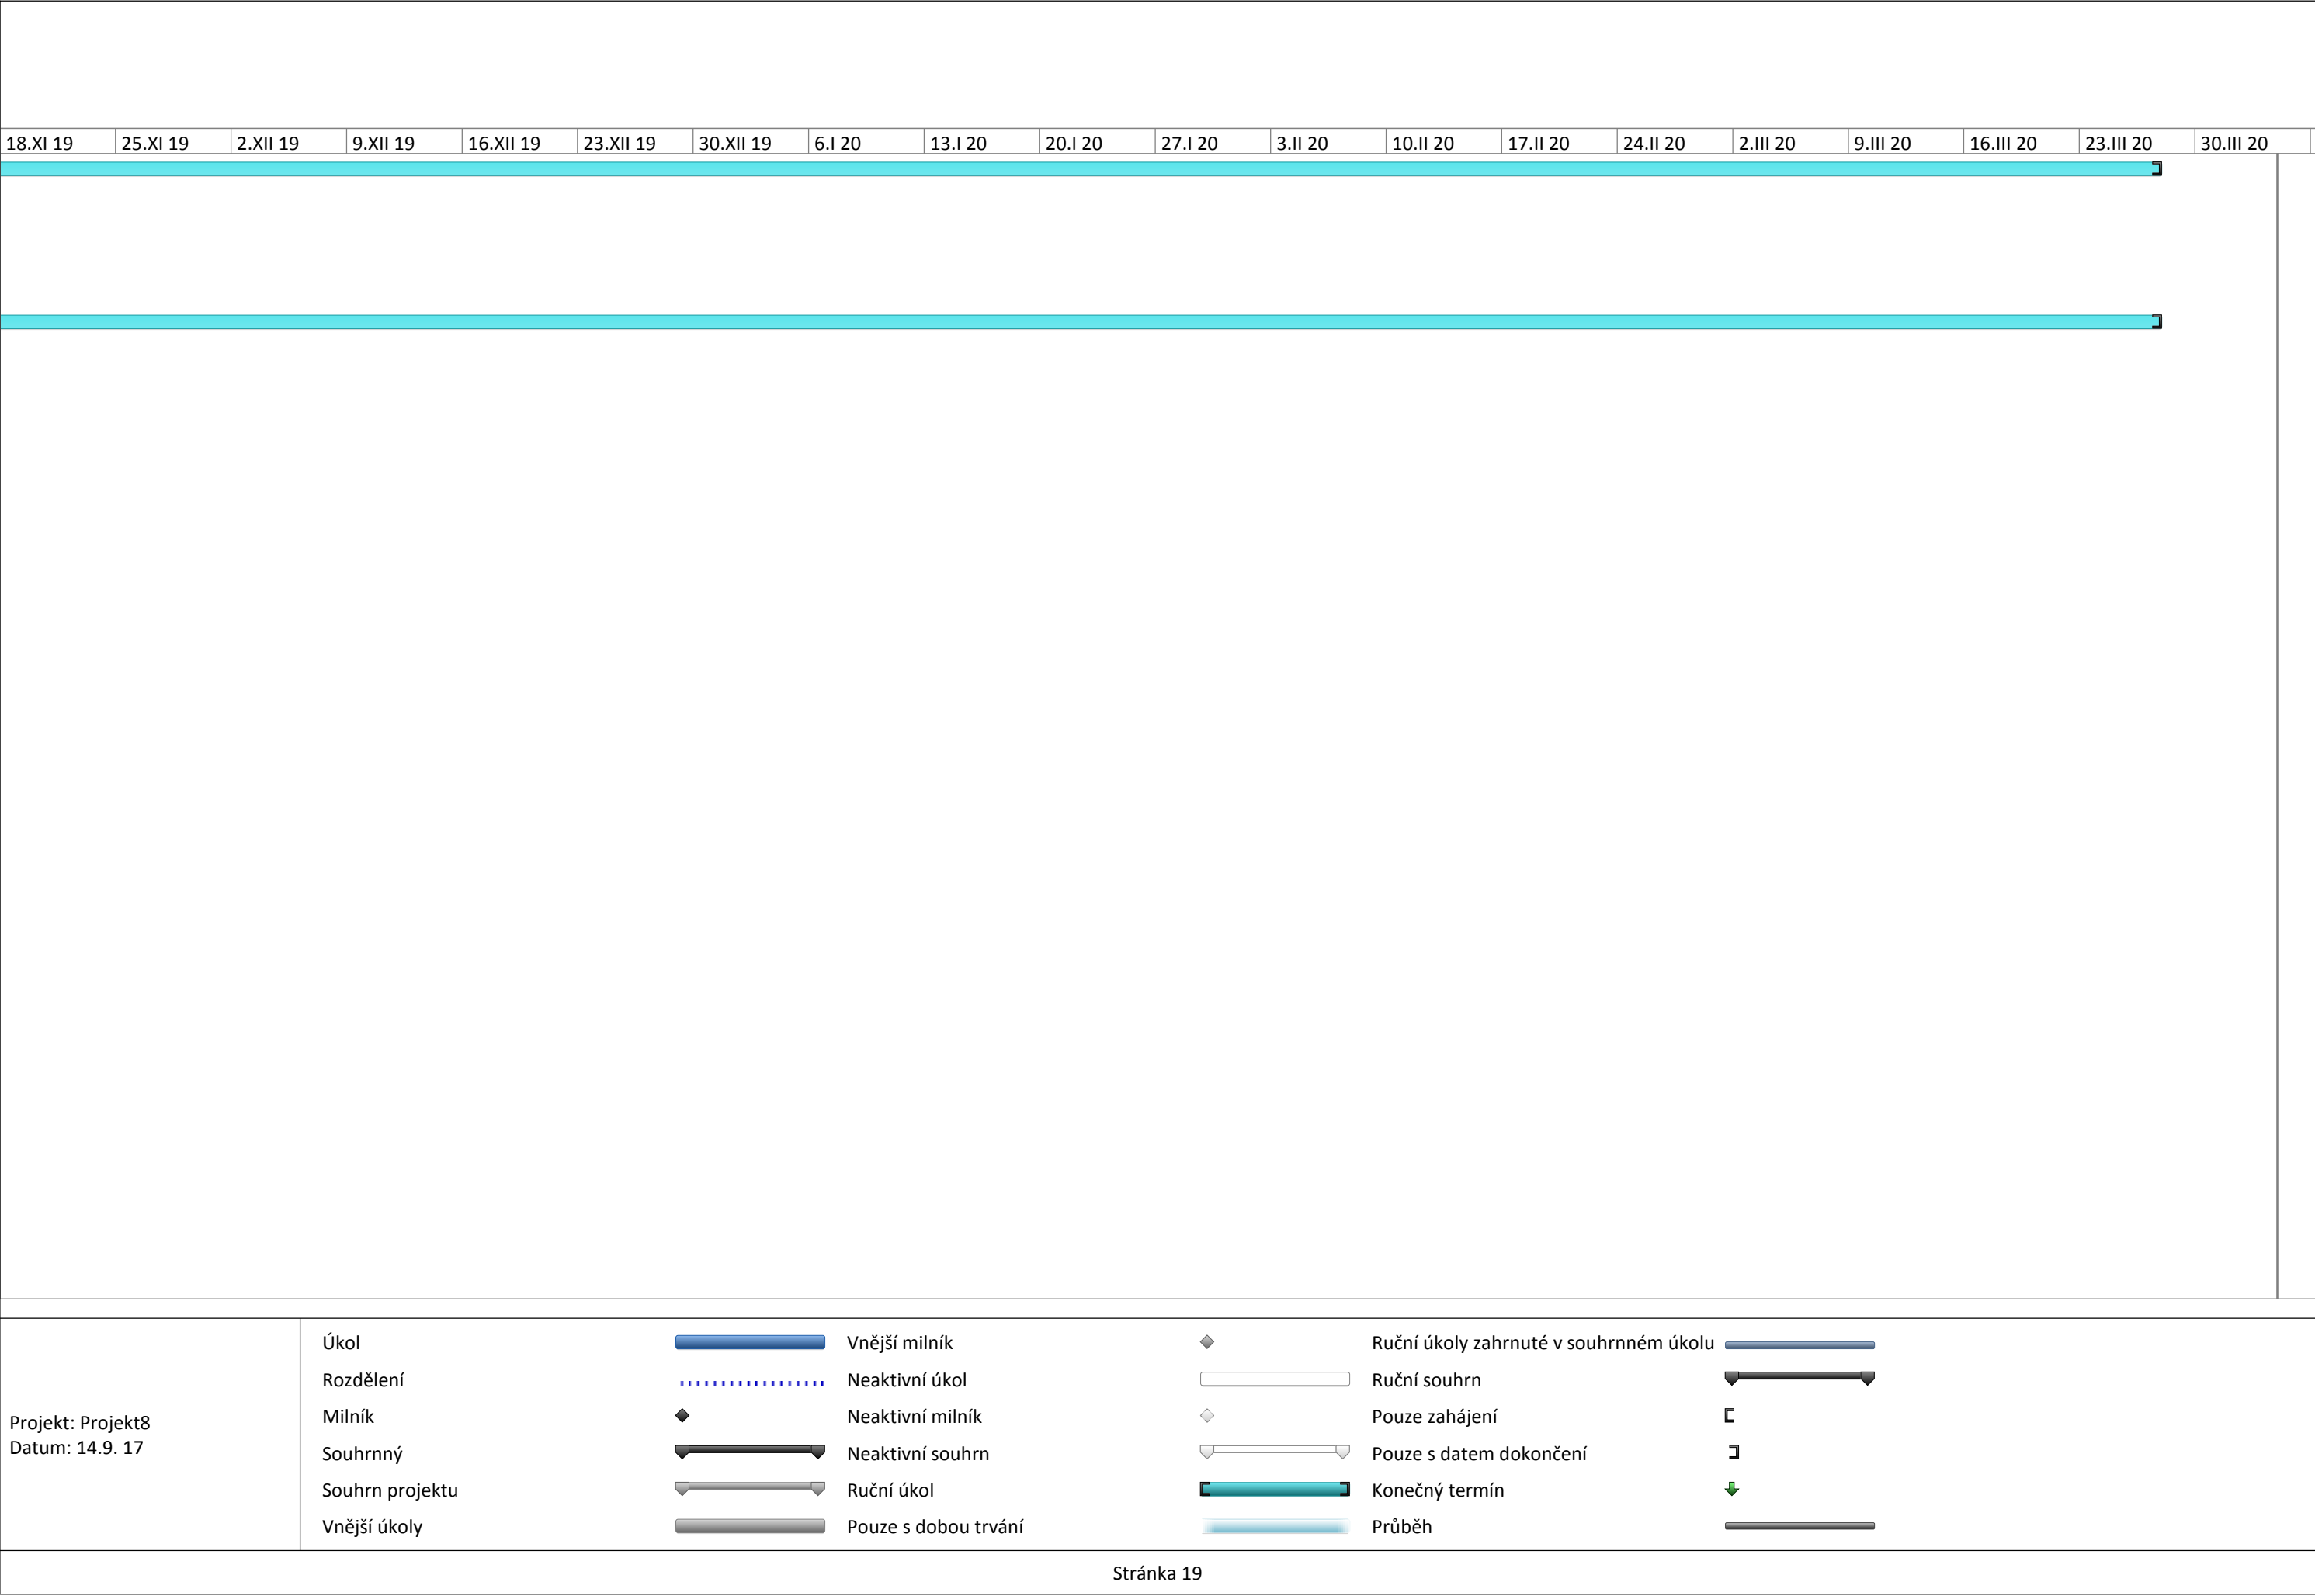

Stránka 19

