

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00913/2024**
č. smlouvy zhotovitele: **856/TB/FC/2024/006/FCFV**
č. dodatku č. 1 objednatele: **01317/2024**
č. dodatku č. 2 objednatele: **01469/2024**
(dále jen jako „**smlouva**“)

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele 1 je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDAKCE]

plánování
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**město Kolín**“)

a

Zhotovitel **STRABAG SIS a.s.**
Zapsaný u MS v Praze, oddíl B, vl. 24650
Sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
Zastoupený Ing. Martin Bašár – předseda představenstva
[REDAKCE]

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]

IČO 453 59 041
DIČ CZ45359041
Telefon [REDAKCE]
e-mail [REDAKCE]
ID datové schránky 5k5equ5
Bankovní spojení ČS a.s.
Číslo účtu 801200379/0800
Hlavní stavbyvedoucí [REDAKCE]
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2024
(dále jen „**dodatek č. 2**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 7. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00913/2024, č. zhotovitele 856/TB/FC/2024/006/FCFV (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Vybudování cyklostezky – ulice Třídvorská, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“) a následně dne 10. 10. 2024 strany uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy.
2. Realizaci změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Ustanovení ze Smlouvy V., bod 1 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – **ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad červenec 2024**
 - termín řádného provedení díla – **úseky 1., 2., 3., 4., a 7.** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **18 týdnů** od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. původní smlouvy o dílo)
 - termín řádného provedení díla – **úseky 5. (křižovatka ulic V Olšinkách/Třídvorská) a 6. (křižovatka ulic Říční/Třídvorská) a sadové úpravy** - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **38 týdnů** od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. původní smlouvy o dílo)
 - nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli

III. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- Harmonogram – Cyklostezka Třídvorská z 4. 11. 2024
- Plán úseků a vjezdů



Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18. 11. 2024, usnesení č. 4793/79/RM/2024.


Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2024.11.19
14:39:55 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta



ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvr. 3, 2024		Čtvr. 4, 2024				Čtvr. 1, 2025			Čtvr. 2, 2025	
						VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
1		Cyklostezka Třídvorská (Dokončení dle II/322 Třídvorská)	264,38 dny	25.07. 24	17.04. 25											
2		Předání PD a staveniště	0 dny	25.07. 24	25.07. 24											
3		Termín dokončení díla "Cyklostezka" dle dodatku 1.	111 dny	25.07. 24	14.11. 24											
4		Datum dokončení (Vyjma křížení V Olšinkách + Říční)	0 dny	28.11. 24	28.11. 24											
5		Úsek 1. (0,78 až 0,86 km) - DOKONČENO	80 dny	25.07. 24	14.10. 24											
10		Úsek 2. (0,70 až 0,78 km)	35 dny	24.10. 24	28.11. 24											
11		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	7 dny	24.10. 24	31.10. 24											
12		Obruby betonové	14 dny	31.10. 24	14.11. 24											
13		Obruby žulové	4 dny	31.10. 24	04.11. 24											
14		Dlažba betonová	14 dny	14.11. 24	28.11. 24											
15		UV1	5 dny	04.11. 24	08.11. 24											
16		Dlažba z kostek drobných	5 dny	18.11. 24	22.11. 24											
17		Úsek 3. (0,87 až 0,97 km) - DOKONČENO	28 dny	10.09. 24	08.10. 24											
21		Úsek 4. (0,98 až 1,30 km)	66 dny	04.09. 24	09.11. 24											
22		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	14 dny	04.09. 24	18.09. 24											
23		Rekonstrukce potrubí svodů	14 dny	18.09. 24	02.10. 24											
24		Obruby betonové	21 dny	18.09. 24	09.10. 24											
25		Podkladní vrstvy	14 dny	02.10. 24	16.10. 24											
26		Dlažba betonová	24 dny	16.10. 24	09.11. 24											
27		Úsek 5. (0,86 až 0,87 km) - křížení ul. V Olšinkách 2025	17 dny	01.04. 25	17.04. 25											
28		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	4 dny	01.04. 25	04.04. 25											
29		Obruby žulové	8 dny	04.04. 25	12.04. 25											
30		Dlažba betonová	5 dny	12.04. 25	17.04. 25											
31		Úsek 6. (0,97 až 0,98 km) - křížení ul. Říční 2025	17 dny	01.04. 25	17.04. 25											
32		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	4 dny	01.04. 25	04.04. 25											
33		Obruby žulové	8 dny	04.04. 25	12.04. 25											
34		Dlažba betonová	5 dny	12.04. 25	17.04. 25											
35		Úsek 7. (1,30 až 1,60 km) - u AVE	18 dny	09.11. 24	28.11. 24											
36		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	5 dny	09.11. 24	14.11. 24											
37		Obruby zahradní	2 dny	15.11. 24	16.11. 24											
38		Obruby žulové	7 dny	15.11. 24	22.11. 24											
39		Dlažba betonová	6 dny	22.11. 24	28.11. 24											
40		Veřejné osvětlení - v souběhu s ul. Třídvorská	85 dny	03.09. 24	28.11. 24											
41		SDZ, VDZ	3 dny	18.11. 24	21.11. 24											
42		Sadové úpravy	21 dny	09.09. 24	30.09. 24											
43		Sadové úpravy 2025	14 dny	03.04. 25	17.04. 25											

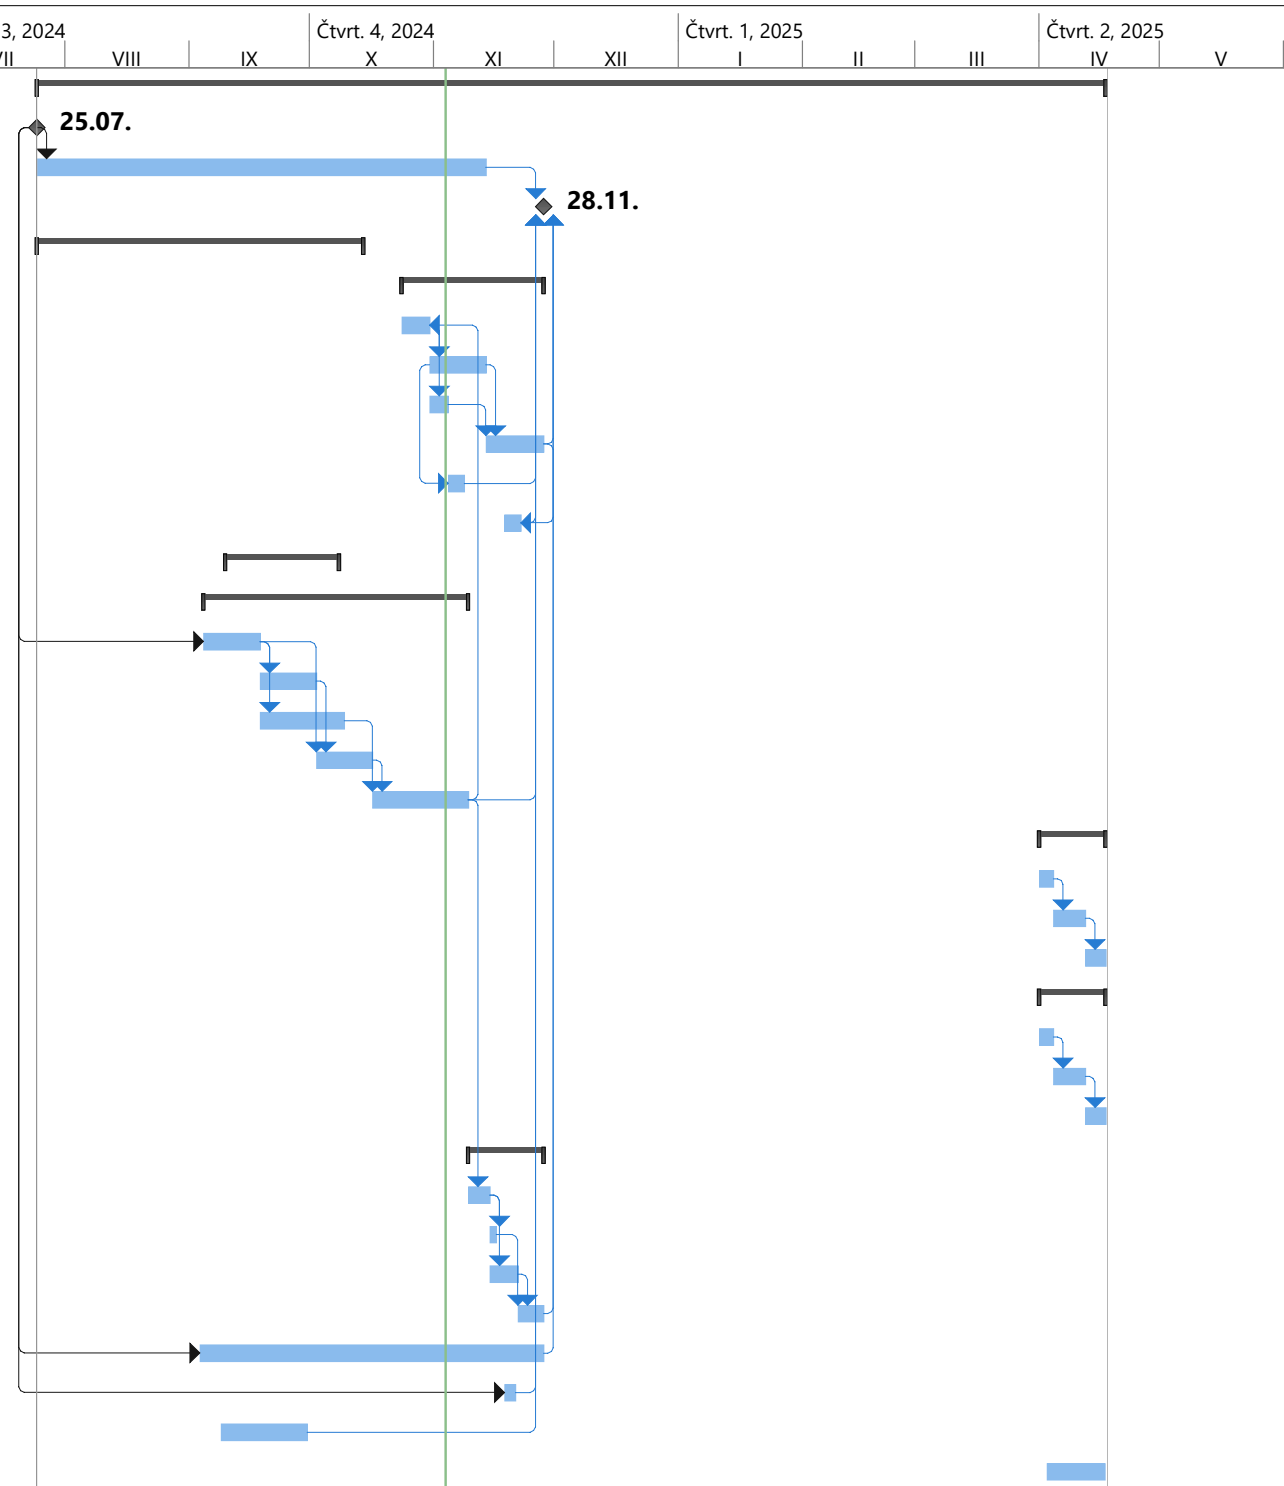

Projekt: HMG Cyklostezka Tříd
Datum: 04.11. 24

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

