

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **00913/2024**
č. smlouvy zhotovitele: **856/TB/FC/2024/006/FCFV**
č. dodatku č. 1 objednatele: **01317/2024**
(dále jen jako „**smlouva**“)

Objednatel **Město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele 1 je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**město Kolín**“)

a

Zhotovitel **STRABAG SIS a.s.**
Zapsaný u MS v Praze, oddíl B, vl. 24650
Sídlo Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice
Zastoupený Ing. Martin Bašár – předseda představenstva

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

ve věcech technických
IČO 453 59 041
DIČ CZ45359041
Telefon
e-mail
ID datové schránky 5k5equ5
Bankovní spojení ČS a.s.
Číslo účtu 801200379/0800
Hlavní stavbyvedoucí
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2024
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 7. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00913/2024, č. zhotovitele 856/TB/FC/2024/006/FCFV (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem

je provedení stavebních a souvisejících prací k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Vybudování cyklostezky – ulice Třídvorská, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

2. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Ustanovení ze Smlouvy V., bod 1 se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení provádění díla – **ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad červenec 2024**
 - termín řádného provedení díla – **úseky 1., 2., 3., 4., a 7.** – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **16 týdnů** od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. původní smlouvy o dílo)
 - termín řádného provedení díla – **úseky 5. (křižovatka ulic V Olšinkách/Třídvorská) a 6. (křižovatka ulic Říční/Třídvorská) a sadové úpravy** - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **38 týdnů** od předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. původní smlouvy o dílo)
 - nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli

III. Smluvní pokuty

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smluvních pokut. Ustanovení ze Smlouvy VIII., bod 1 se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas některý z úseků díla v termínech uvedených v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného úseku objednateli.

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- Harmonogram – Cyklostezka Třídvorská z 25.9.2024
- Plán úseků a vjezdů

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 7. 10. 2024, usnesení č. 4538/74/RM/2024.

Mgr.
Michael
Kašpar

Digitálně podepsal
Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2024.10.10
10:13:47 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.10.09
15:02:54 +02'00'


.....
k
poucí oblasti

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.09
14:05:59 +02'00'


.....
a
á

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2024			Čtvrt. 4, 2024			Čtvrt. 1, 2025			Čtvrt. 2, 2025					
						VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
1		Cyklostezka Třídvorská (Dokončení dle II/322 Třídvorská)	264,38 dny	25.07. 24	17.04. 25															
2		Předání PD a staveniště	0 dny	25.07. 24	25.07. 24															
3		Termín dokončení díla "Cyklostezka"	120 dny	25.07. 24	22.11. 24															
4		Datum dokončení (Vyjma křížení V Olšinkách + Říční)	0 dny	22.11. 24	22.11. 24															
5		Úsek 1. (0,78 až 0,86 km)	60 dny	25.07. 24	24.09. 24															
6		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	25 dny	25.07. 24	19.08. 24															
7		Obruby zahradní	21 dny	19.08. 24	09.09. 24															
8		Dlažba betonová	7 dny	10.09. 24	17.09. 24															
9		Výměna přístřešku MHD	60 dny	25.07. 24	24.09. 24															
10		Úsek 2. (0,70 až 0,78 km)	30 dny	24.10. 24	22.11. 24															
11		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	7 dny	24.10. 24	31.10. 24															
12		Obruby zahradní	14 dny	31.10. 24	14.11. 24															
13		Obruby žulové	4 dny	31.10. 24	04.11. 24															
14		Dlažba betonová	9 dny	14.11. 24	22.11. 24															
15		Dlažba z kostek drobných	2 dny	04.11. 24	06.11. 24															
16		Úsek 3. (0,87 až 0,97 km)	28 dny	10.09. 24	08.10. 24															
17		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	7 dny	10.09. 24	17.09. 24															
18		Obruby zahradní	7 dny	17.09. 24	24.09. 24															
19		Dlažba betonová	14 dny	24.09. 24	08.10. 24															
20		Úsek 4. (0,98 až 1,30 km)	49 dny	04.09. 24	23.10. 24															
21		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	14 dny	04.09. 24	18.09. 24															
22		Obruby zahradní	21 dny	18.09. 24	09.10. 24															
23		Dlažba betonová	14 dny	09.10. 24	23.10. 24															
24		Úsek 5. (0,86 až 0,87 km) - křížení ul. V Olšinkách 2025	17 dny	01.04. 25	17.04. 25															
25		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	4 dny	01.04. 25	04.04. 25															
26		Obruby žulové	8 dny	04.04. 25	12.04. 25															
27		Dlažba betonová	5 dny	12.04. 25	17.04. 25															
28		Úsek 6. (0,97 až 0,98 km) - křížení ul. Říční 2025	17 dny	01.04. 25	17.04. 25															
29		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	4 dny	01.04. 25	04.04. 25															
30		Obruby žulové	8 dny	04.04. 25	12.04. 25															
31		Dlažba betonová	5 dny	12.04. 25	17.04. 25															
32		Úsek 7. (1,30 až 1,60 km) - u AVE	17 dny	09.10. 24	26.10. 24															
33		Odstranění podkladů + Vytrhání obrub	5 dny	09.10. 24	15.10. 24															
34		Obruby zahradní	2 dny	15.10. 24	16.10. 24															
35		Obruby žulové	7 dny	15.10. 24	22.10. 24															
36		Dlažba betonová	5 dny	22.10. 24	26.10. 24															
37		Veřejné osvětlení - v souběhu s ul. Třídvorská	60 dny	03.09. 24	02.11. 24															
38		SDZ, VDZ	3 dny	13.11. 24	15.11. 24															
39		Sadové úpravy	21 dny	09.09. 24	30.09. 24															
40		Sadové úpravy 2025	14 dny	03.04. 25	17.04. 25															

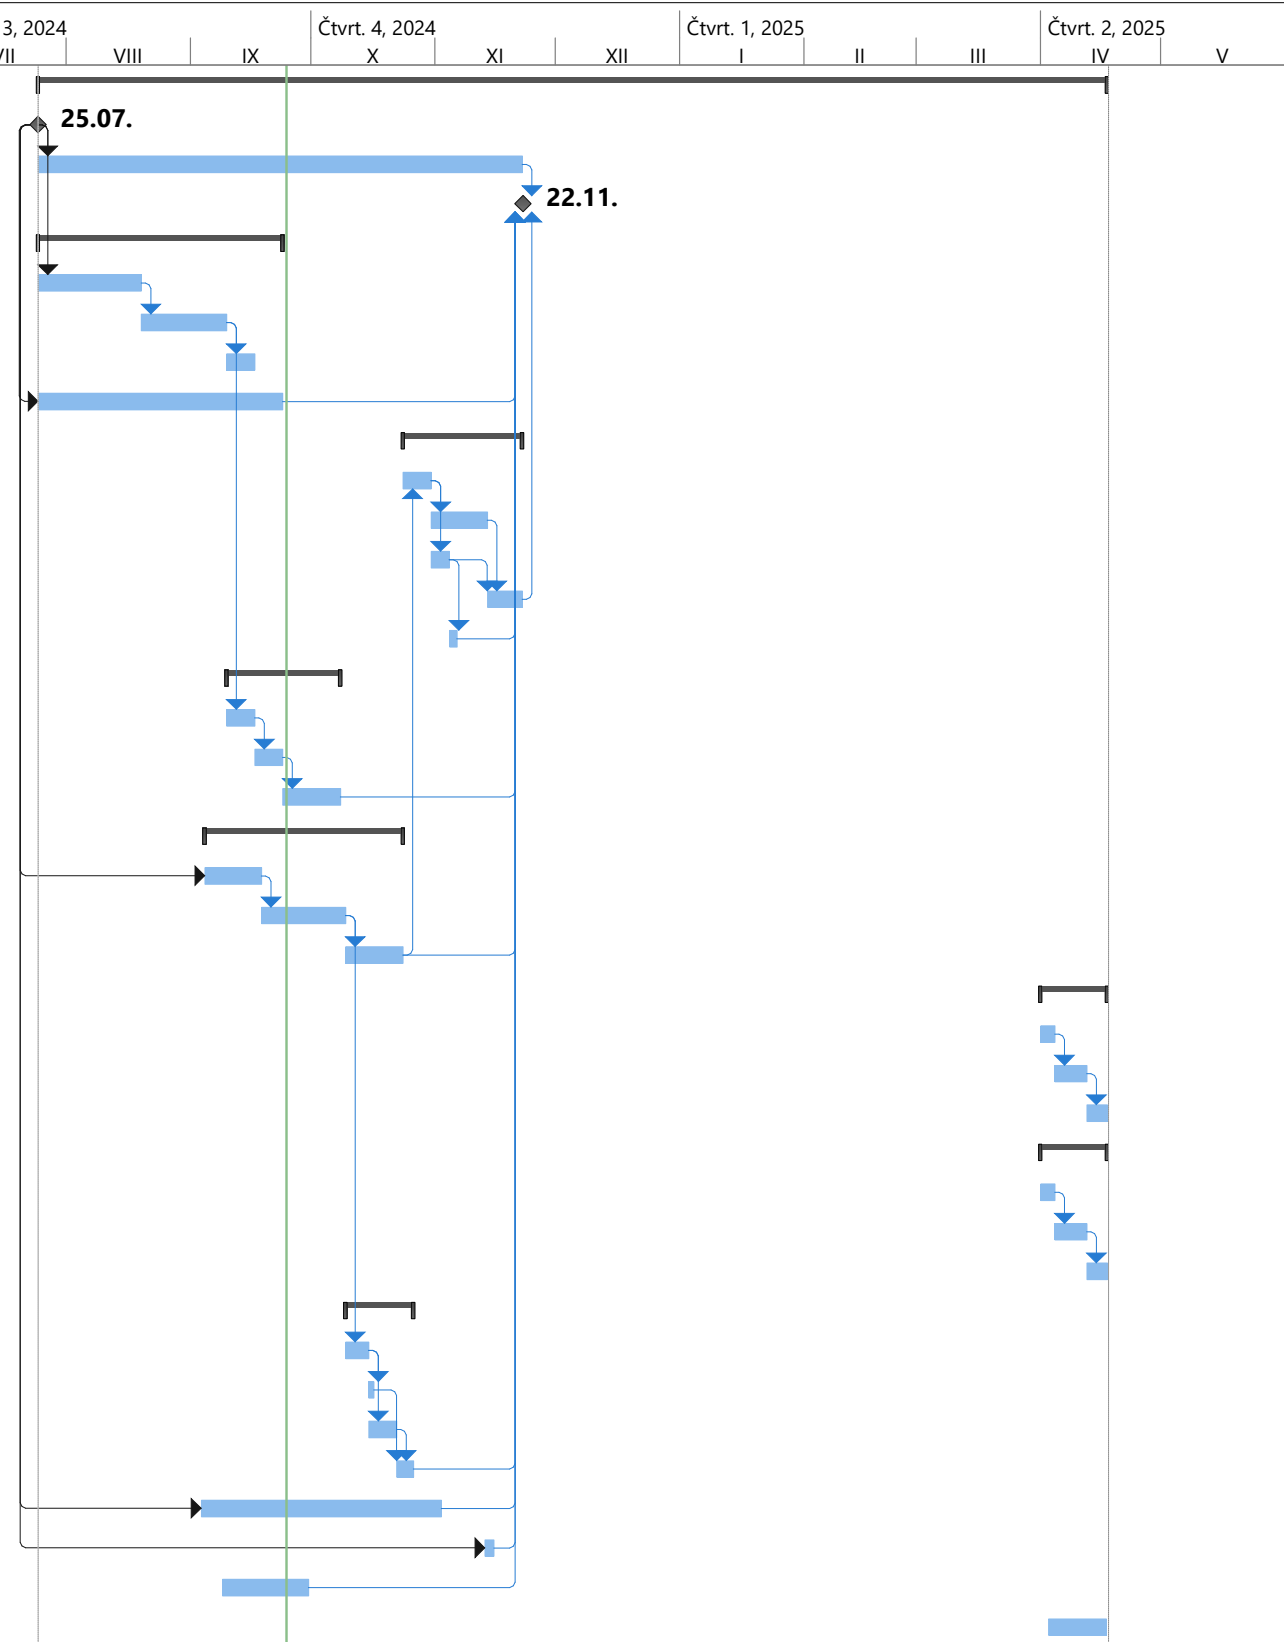

Projekt: HMG Cyklostezka Tříd
Datum: 25.09. 24

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Pouze s dobou trvání		Přůběh	
Milník		Neaktivní souhrn		Ruční úkol		Vnější úkoly		Přůběh ručně zadaného úkolu			
Souhrnný											
Souhrn projektu											

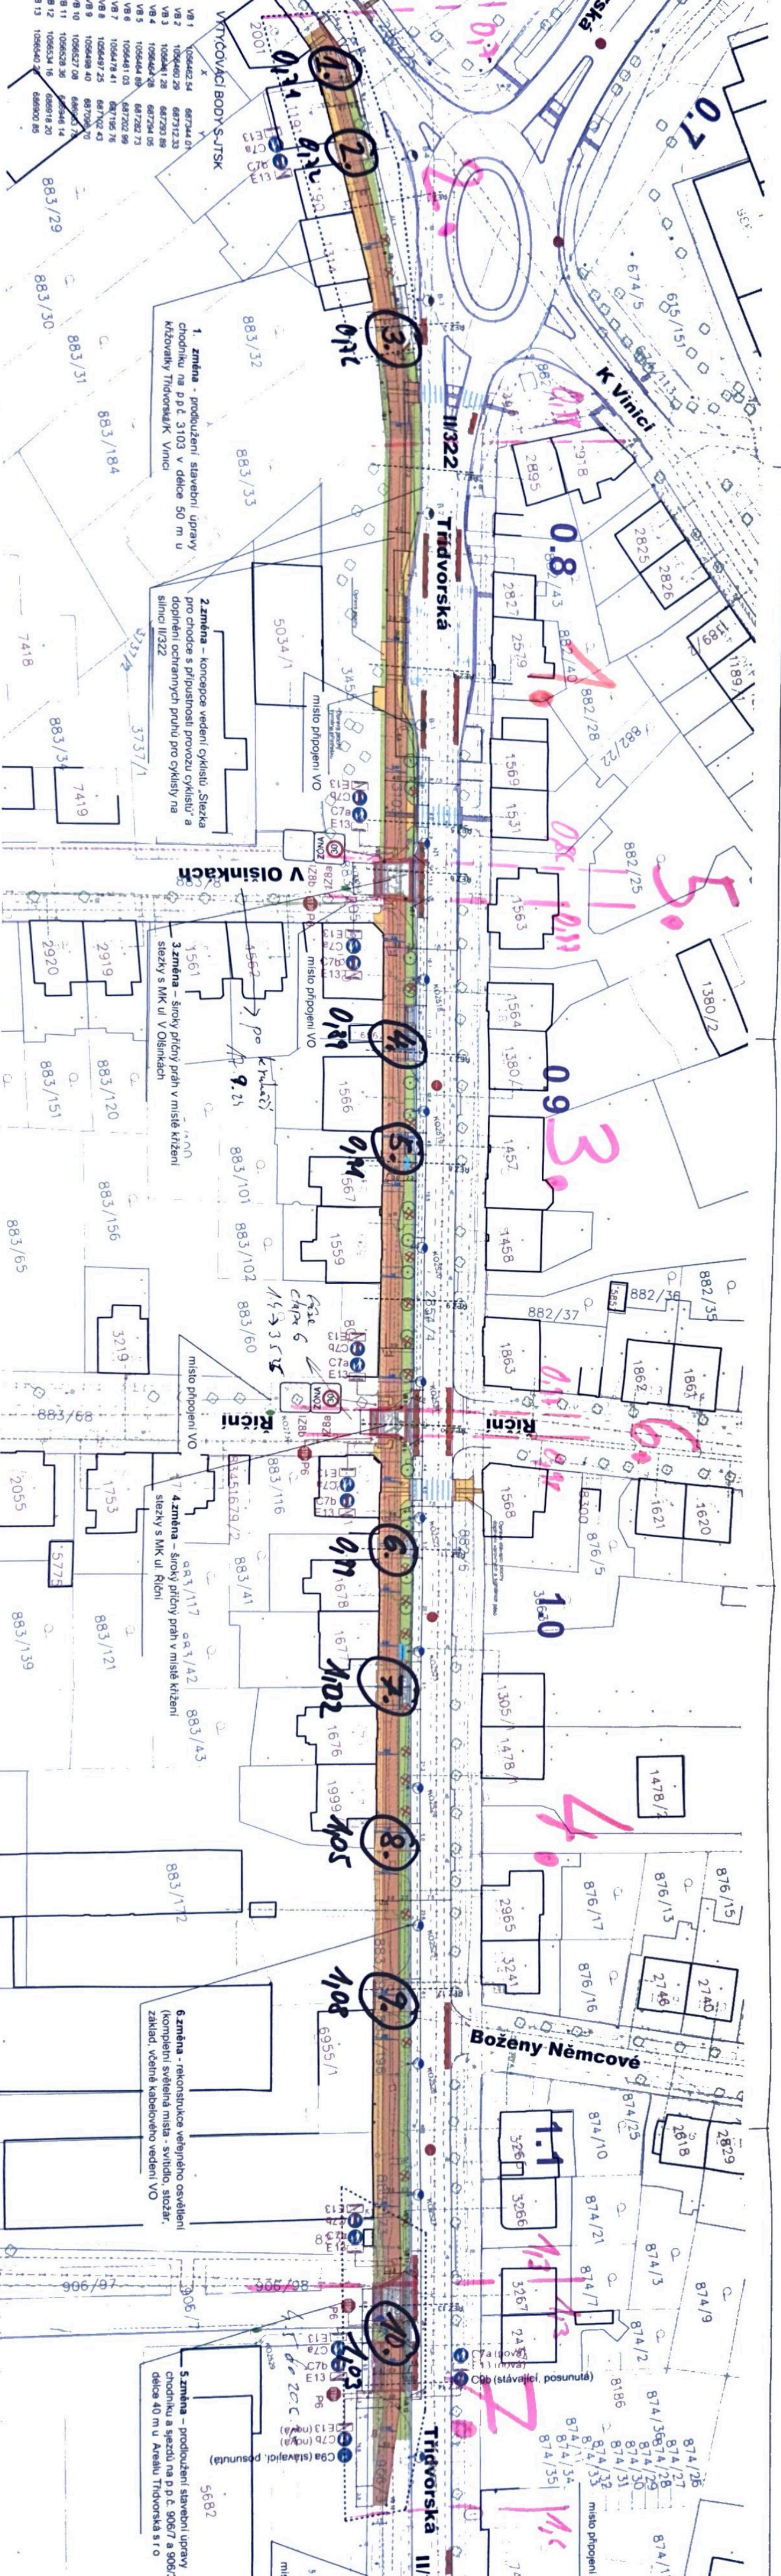

1. změna - prodloužení stavební úpravy chodníku na p.č. 3103 v délce 50 m u křižovatky Tridvorská/K Vinici

2.změna - koncepce vedení cyklistů „Stežka pro chodce s připustností provozu cyklistů“ a doplnění ochranných pruhů pro cyklisty na silnici II/322

3.změna - široký příčný pruh v místě křížení stežky s MK ul v Olšínkách

4.změna - široký příčný pruh v místě křížení stežky s MK ul Říční

6.změna - rekonstrukce veřejného osvětlení (kompletní světelná místa - svítidlo, stojan, základ, včetně kabelového vedení VO

5.změna - prodloužení stavební úpravy chodníku a stežky na p.č. 906/7 a 906/ dělice 40 m u Areálu Tridvorská s r.o

VATYCOVACÍ BODY S-JTSK

VB 2	1056462 54	68734 07
VB 3	1056460 29	687312 23
VB 4	1056461 28	687293 89
VB 5	1056464 28	687294 05
VB 6	1056464 89	687282 73
VB 7	1056478 41	687195 76
VB 8	1056497 25	68702 43
VB 9	1056498 40	68702 70
VB 10	1056527 08	68693 78
VB 11	1056528 36	68694 14
VB 12	1056534 16	686918 20
VB 13	1056540 28	686900 85

883/29	883/30	883/31	883/184	883/34	7419	883/35	7418
883/32	883/33	883/34	883/184	883/35	7419	883/36	7418

883/120	883/156	883/151	883/65	883/101	883/102	883/60	883/68
883/120	883/156	883/151	883/65	883/101	883/102	883/60	883/68

883/117	883/42	883/43	883/121	883/116	883/117	883/41	883/121
883/117	883/42	883/43	883/121	883/116	883/117	883/41	883/121

883/172	883/108	883/112	883/139	883/116	883/117	883/41	883/121
883/172	883/108	883/112	883/139	883/116	883/117	883/41	883/121

883/112	883/108	883/112	883/139	883/116	883/117	883/41	883/121
883/112	883/108	883/112	883/139	883/116	883/117	883/41	883/121

883/112	883/108	883/112	883/139	883/116	883/117	883/41	883/121
883/112	883/108	883/112	883/139	883/116	883/117	883/41	883/121
