



00984/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 984/2017

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:



MKOLP001KYYB

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel**město Kolín**

Sídlo

Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Zastoupený

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s. Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města

Zástupce objednatele ve věcech technických

Ing. Martin Tichý, tel.: 321 748 353, GSM: 777 297 479,

e-mail: martin.tichy@mukolin.cz

Ing. Miroslav Káninský, tel.: 321 748 293, GSM: 728 657 769,

e-mail: miroslav.kaninsky@mukolin.cz

(dále: „objednatel“)

Zhotovitel**STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha**

Sídlo

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov

Zastoupený

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

V zastoupení dle plné moci jednájí

Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk Pavlů, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

IČ

60838744

DIČ

CZ 60838744

Bankovní spojení

Číslo účtu

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, složce 7634

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

Eduard Mach, tel: 606 616 451,

e-mail: eduard.mach@strabag.com

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále
jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výstavba dopravního terminálu Kolín“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 12.04.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele **513/2017** na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Výstavba dopravního terminálu Kolín**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo týkající se těchto stavebních objektů:

- SO 001
- SO 301
- SO 801
- SO 802

Popis, specifikaci a zdůvodnění změn včetně navýšení ceny obsahují změnové listy č. 1 – 4:

Změnový list č. 1	743.512,71 Kč
Změnový list č. 2	271.239,57 Kč
Změnový list č. 3	9.853,98 Kč
Změnový list č. 4	46.574,00 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH	1.071.180,26 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	224.947,85 Kč
cena celkem včetně DPH	1.296.128,11 Kč

Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	49.966.332,52 Kč
Celkem DPH	10.492.929,83 Kč
Cena díla včetně DPH	60.459.262,35 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.


III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.04.2017 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 21. 8. 2017, usnesení č. 37773/111/RM/2017.

V Kolíně dne 20.10.2017




starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



20.10.2017

V Benátkách nad Jizerou dne



.....

za

Ing

ek

na základě plné moci



Ing. Luděk Pavlů
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
na základě plné moci

Změnový list č. 1	5.6.2017
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 001. Dle RDS bylo navrženo při bourání konstrukce vozovky v ulici Rorejcova odfrézovat asfaltové vrstvy a odtěžit štěrkové lože v tl. 300 mm. Při zahájení bouracích prací se však ukázalo, že stávající vozovka je na většině plochy tvořena asfaltovými vrstvami a vrstvou betonu. Vrstvu betonu bylo nutné odbourat viz fotodokumentace. Vrstva byla geodeticky zaměřena. Projekční firma AF-CITYPLAN s.r.o. v zastoupení projektanta Matěje Rýdla vydala k uvedené změně vyjádření, které ke změně dokládáme. Z tohoto vyjádření vyplývá, že změna nemohla být ze strany zadavatele jednatel s náležitou péčí předvídatelná. Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, paragrafu 222, náleží změna do parametrů odst. 6.
Specifikace změny	Položky odtěžení štěrkového lože včetně dopravy a uložení na skládku byly nahrazeny položkami pro bourání betonu včetně dopravy a uložení na skládku.
Zdůvodnění změny	Bylo třeba odfrézovat asfaltové vrstvy stávající vozovky a také vrstvy betonu pod asfaltem, se kterými se nemohlo počítat. Dochází tak ke změnám původního projektu, viz změnový list.

Vypracoval :

Ing. Kristýna Havlátová

Datum :

5.6.2017

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Eduard Mach		- 5 -06- 2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		- 5 -06- 2017
projektant/AD		
Matěj Rýdl		- 5 -06- 2017
zadavatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		- 5 -06- 2017

Změnový list č. 1

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/000185							Změnový list č. 1					
SO 001 - Příprava staveniště			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
					Jednot.							
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
68	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	194,11	5,05	980,24	2 566,41	5,05	12 960,35	2 372,30	5,05	11 980,12
69	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 717,48	1,59	4 320,80	35 929,68	1,59	57 128,20	33 212,20	1,59	52 807,40
70	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	1 574,45	53,49	84 217,44	3 946,75	53,49	211 111,76	2 372,30	53,49	126 894,33
		NOVÉ POLOŽKY										
75	R1137012321	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl. 280 mm	m2	0,00	0,00	0,00	3 389,00	162,83	551 830,87	3 389,00	162,83	551 830,87

Cena díla bez DPH SoD							3 651 897,01					
DPH 21%							766 898,37					
Cena díla včetně DPH							4 418 795,38					
Cena díla bez DPH ZBV1							4 395 409,72	Rozdíl a odpočty bez DPH			743 512,71	
DPH 21%							923 036,04	DPH 21%			156 137,67	
Cena díla včetně DPH							5 318 445,76	Rozdíl včetně DPH			899 650,38	

Zhotovitel/dodavatel:

Firma **Eduard Mach**

Datum

- 5 -06- 2017

Schválil:

TDI **Ing. Martin Nepraš**

Datum

- 5 -06- 2017

Projektant **Matěj Rýdl**

Datum

- 5 -06- 2017

Objednatel **Ing. Miroslav Káninský**

Datum

- 5 -06- 2017



Zdůvodnění změny

Před samotným zahájením projektu byly provedeny průzkumné práce, které zahrnovaly mimo jiné dopravní průzkum dané lokality.


Tento průzkum pomohl zařadit danou MK dle intenzity těžkých nákladních vozidel (TNV_k) do třídy dopravního zatížení IV, pro kterou platí rozmezí 101 – 500 TNV_k.

Důvodem, proč byly v soupisu prací použity šterkové podkladní vrstvy ve vozovkovém souvrství, plynuly z technických podmínek TP 78 (katalog vozovek PK), které určovaly jednotlivé vozovkové vrstvy v době realizace původní komunikace v ul. Rorejčova s tím, že dle dané třídy dopravního zatížení technické podmínky neuváděly jakékoli skladby, které by obsahovaly podkladní beton (PB).

Jednalo se tedy o netypické řešení, které TP nezohledňují.

Proto tyto vrstvy nebyly součástí soupisu prací.

Rovněž v současnosti, kdy TP 78 pozbývají platnosti a jsou nahrazeny TP 170 (navrhování vozovek PK), neuvádí pro danou třídu dopravního zatížení možnost použití podkladních vrstev v podobě PB.



Vyp

Projektant dopravních staveb

AF-CITYPLAN s.r.o., Ateliér dopravní projekce, Oddělení silnic


Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13 | 140 00 Praha 4 | Česká republika

Tel.: +420 277 005 552 | Mob.: +420 735 750 818 | Fax: +420 224 922 072

matej.rydl@afconsult.com | www.afconsult.com | www.af-cityplan.cz

ÅF - Green Advisor to four National Olympic Committees



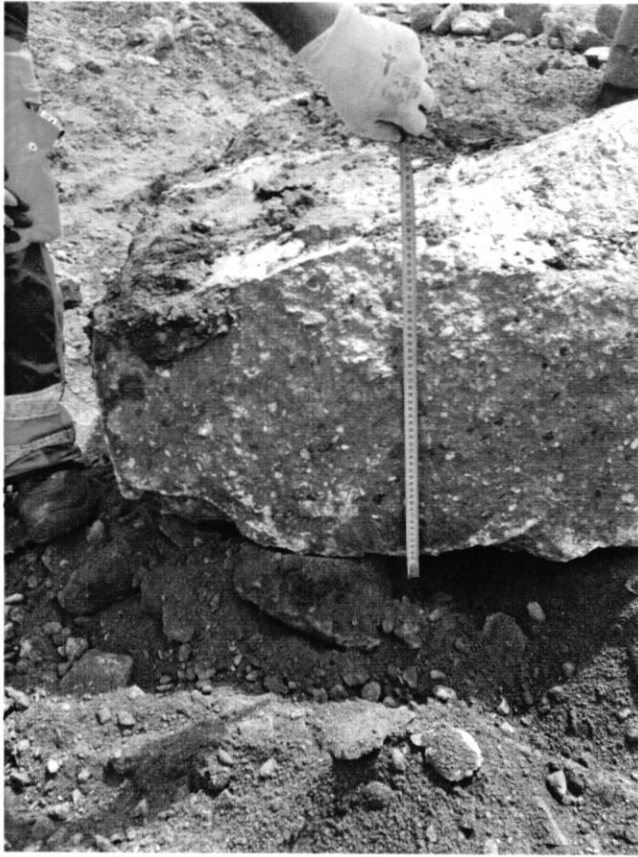

Změnový list č. 2		26.6.2017
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858	

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 301. Došlo ke změně materiálu kanalizačního potrubí (výměna kameninového potrubí na potrubí PP ULTRA RIBB) a přidání podružné trasy kanalizace pro optimalizaci odvodnění rekonstruované plochy. Stávající vodoměrné šachty, které se nacházejí v pojízdných plochách, je nutné zrekonstruovat. Strop šachet byl nově vybudován pomocí PZD panelů a a žel. bet. desky. V SO 107 řez 0,20 -0,40 byl osazen odvodňovací žlab pro dostatečné odvodnění přilehlé plochy. Ke změně dokládáme vyjádření provozovatele kanalizace, VODOS s.r.o. Kolín, ze kterého vyplývá, že v době přípravy projektu nebylo možné s jeho nynějšími požadavky počítat ani je předpokládat. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, paragrafu 222 se změna řadí do parametrů odstavce č. 6.
Specifikace změny	Položky kanalizace z kameninových trub byly nahrazeny odpovídajícími položkami pro plastové potrubí PP ULTRA RIBB. Došlo i k navýšení rozsahu kanalizace na základě požadavku provozovatele kanalizace. Byly nově přidány položky pro odvodňovací žlab a rekonstrukci stávajících vodoměrných šachet.
Zdůvodnění změny	- Na základě dodatečných podmínek provozovatele kanalizace vydaných dne 15.6.2017 byl objekt SO 301 - Revize kanalizace přeprojektován dle požadavků provozovatele viz. příloha . - vzhledem k nedostatečnému odvodnění plochy SO 107 řez 0,20 - 0,40 bylo nutné dodatečně osadit odvodňovací žlab. - v pojízdné ploše SO 107 byly odkryty stávající vodoměrné šachty, vzhledem k jejich havarijnímu stavu bylo nutné přistoupit k jejich rekonstrukci.

Vypracoval : Ing. Kristýna Havlátová

Datum : 26.6.2017

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Eduard Mach		26 -06- 2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		26 -06- 2017
projektant/AD		
Matěj Rýdl		26 -06- 2017
zadavatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		26 -06- 2017

Změnový list č. 2

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.370.0/0.0/16_029/000/1858										Změnový list č. 2														
SO 301 - Revize kanalizace										Částka a výměra dle smlouvy					Skutečný provedený stav					Rozdíl a odpočty				
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem									
3	132201101	Zemní práce																						
4	132201109	Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,200	101,94	1 651,43	0	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94	-16,20	101,94	-1 651,43									
5	132201202	Příplatek za lepkost k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,620	4,05	6,56	0	0,00	0,00	0,00	4,05	4,05	-1,62	4,05	-6,56									
6	132201209	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	842,122	166,76	140 432,26	891,440	166,76	148 656,53	49,32	166,76	166,76	49,32	166,76	8 224,27									
7	151101101	Příplatek za lepkost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	84,212	4,05	341,06	89,144	4,05	361,03	4,93	4,05	4,05	4,93	4,05	19,97									
8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	149,832	103,01	15 434,19	1513,372	103,01	155 892,45	1 363,54	103,01	103,01	1 363,54	103,01	140 458,26									
9	151101111	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2143,151	126,28	270 637,11	907,200	126,28	114 561,22	-1 235,95	126,28	126,28	-1 235,95	126,28	-156 075,89									
10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	149,832	16,21	2 428,78	1513,370	16,21	24 531,73	1 363,54	16,21	16,21	1 363,54	16,21	22 102,95									
11	161101101	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2143,151	18,76	34 740,48	907,200	18,76	14 705,71	-1 235,95	18,76	18,76	-1 235,95	18,76	-20 034,77									
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	353,500	18,76	6 631,66	732,680	18,76	13 745,08	379,18	18,76	18,76	379,18	18,76	7 113,42									
13	162701105	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	488,622	25,01	12 220,44	158,780	25,01	3 970,59	-329,86	25,01	25,01	-329,86	25,01	-8 249,85									
14	162701109	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	155,021	47,07	7 296,84	100,699	47,07	4 739,90	-54,32	47,07	47,07	-54,32	47,07	-2 556,94									
15	17201211	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	775,105	4,28	3 317,45	503,495	4,28	2 154,96	-271,61	4,28	4,28	-271,61	4,28	-1 162,49									
16	174101101	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	279,038	53,49	14 925,74	201,398	53,49	10 772,78	-77,64	53,49	53,49	-77,64	53,49	-4 152,96									
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	m3	703,301	182,49	128 345,40	790,741	182,49	144 302,33	87,44	182,49	182,49	87,44	182,49	15 956,93									
18	831262191	Trubní vedení				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
19	831262191	Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon nad 20 % DN do 300	m	45,500	75,04	3 414,32	0,000	75,04	75,04	-45,50	75,04	75,04	-45,50	75,04	-3 414,32									
20	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	236,000	71,78	16 940,08	0,000	71,78	71,78	-236,00	71,78	71,78	-236,00	71,78	-16 940,08									
21	597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	m	187,288	340,17	63 702,96	0,000	340,17	340,17	-187,27	340,17	340,17	-187,27	340,17	-63 702,96									
22	597106510	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F	m	15,225	395,79	6 025,90	0,000	395,79	395,79	-15,23	395,79	395,79	-15,23	395,79	-6 025,90									
23	597106320	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	m	52,780	447,14	23 600,05	0,000	447,14	447,14	-52,78	447,14	447,14	-52,78	447,14	-23 600,05									
24	831312193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou díků trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	5,00	108,04	540,20	0,000	108,04	108,04	-5,00	108,04	108,04	-5,00	108,04	-540,20									
25	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	126,430	82,52	10 433,00	0,000	82,52	82,52	-126,43	82,52	82,52	-126,43	82,52	-10 433,00									
26	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém G Trída 240	m	139,563	584,06	81 513,17	0,000	584,06	584,06	-139,56	584,06	584,06	-139,56	584,06	-81 513,17									
27	837311221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 150	kus	4,000	64,82	259,28	0,000	64,82	64,82	-4,00	64,82	64,82	-4,00	64,82	-259,28									
28	597115400	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/150 L50cm spojovací systém F/F	kus	4,060	593,69	2 410,38	0,000	593,69	593,69	-4,06	593,69	593,69	-4,06	593,69	-2 410,38									
29	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	199,000	54,02	10 749,98	0,000	54,02	54,02	-199,00	54,02	54,02	-199,00	54,02	-10 749,98									
30	597109440	koleno kameninové glazované DN150mm 15° spojovací systém F	kus	70,035	345,52	24 198,49	0,000	345,52	345,52	-70,04	345,52	345,52	-70,04	345,52	-24 198,49									
31	597109640	koleno kameninové glazované DN150mm 30° spojovací systém F	kus	81,200	345,52	28 056,22	0,000	345,52	345,52	-81,20	345,52	345,52	-81,20	345,52	-28 056,22									
32	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	18,270	345,52	6 312,85	0,000	345,52	345,52	-18,27	345,52	345,52	-18,27	345,52	-6 312,85									
33	597108720	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN150mm L60(75)cm spojovací systém F	kus	28,420	240,68	6 840,13	0,000	240,68	240,68	-28,42	240,68	240,68	-28,42	240,68	-6 840,13									
34	597125070	přechod kameninový glazovaný DN100/150mm spojovací systém F/F	kus	9,135	317,70	2 902,19	0,000	317,70	317,70	-9,14	317,70	317,70	-9,14	317,70	-2 902,19									
35	597118520	určávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F	kus	33,495	106,97	3 582,96	0,000	106,97	106,97	-33,50	106,97	106,97	-33,50	106,97	-3 582,96									
36	837314115	Montáž napojovací kameninové tvarovky DN 150 včetně vrtání otvoru do potrubí	kus	23,000	54,02	1 242,46	0,000	54,02	54,02	-23,00	54,02	54,02	-23,00	54,02	-1 242,46									
37	597108725	tvarovka kameninová, napojovací kameninový element C DN 150	kus	23,345	1386,34	32 364,11	0,000	1386,34	1386,34	-23,35	1386,34	1386,34	-23,35	1386,34	-32 364,11									
38	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	5,000	64,82	324,10	0,000	64,82	64,82	-5,00	64,82	64,82	-5,00	64,82	-324,10									
39	597115430	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř. 160/-	kus	5,075	1001,25	5 081,34	0,000	1001,25	1001,25	-5,08	1001,25	1001,25	-5,08	1001,25	-5 081,34									
40	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	39,000	54,02	2 106,78	0,000	54,02	54,02	-39,00	54,02	54,02	-39,00	54,02	-2 106,78									
41	597109470	koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	kus	16,240	1092,17	17 736,84	0,000	1092,17	1092,17	-16,24	1092,17	1092,17	-16,24	1092,17	-17 736,84									
42	597109670	koleno kameninové glazované DN200mm 30° spojovací systém F tř. 240	kus	14,210	1092,17	15 519,74	0,000	1092,17	1092,17	-14,21	1092,17	1092,17	-14,21	1092,17	-15 519,74									

42	591108730	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN200mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém F.C	kus	5,075	395,79	2 008,63	0,000	395,79	0,00	-5,08	395,79	-2 008,63
43	59125140	přechod kameninový glazovaná DN150/200mm spojovací systém F.F. tř. /160	kus	4,060	416,12	1 689,45	0,000	416,12	0,00	-4,06	416,12	-1 689,45
44	591108735	trouba kameninová, napojovací kameninový element C DN 200	kus	9,000	54,02	486,18	0,000	54,02	0,00	-9,00	54,02	-486,18
45	837354115	Montáž napojovací kameninové tvarovky DN 200 včetně vrtání otvoru do potrubí	kus	9,135	1901,94	17 374,22	0,000	1901,94	0,00	-9,14	1901,94	-17 374,22
46	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	1,000	7487,97	7 487,97	0,000	7487,97	0,00	-1,00	7487,97	-7 487,97
47	597115740	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá s křm DN300/200 L60cm spojovací systém C/F tř 240/160	kus	1,015	2723,48	2 764,33	0,000	2723,48	0,00	-1,02	2723,48	-2 764,33
48	5971107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C. Třída 240	m	2,538	1544,66	3 920,35	0,000	1544,66	0,00	-2,54	1544,66	-3 920,35
49	8773715211	Montáž tvarovky z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000	kus	9,000	43,22	388,98	0,000	43,22	0,00	-9,00	43,22	-388,98
50	286115400	Montáž kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 110	kus	9,135	317,70	2 902,19	0,000	317,70	0,00	-9,14	317,70	-2 902,19
51	895941111	přechod na kameninové potrubí z betonových uličků typ UV-50 normální	kus	33,000	1 074,52	35 459,16	32,000	1 074,52	34 384,64	-1,00	1 074,52	-1 074,52
52	592238640	stěnová betonová pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	33,000	121,95	4 024,35	32,000	121,95	3 902,40	-1,00	121,95	-121,95
53	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	33,000	254,59	8 401,47	32,000	254,59	8 146,88	-1,00	254,59	-254,59
54	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	32,000	265,29	8 489,28	31,000	265,29	8 223,99	-1,00	265,29	-265,29
56	592238505	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 150 45x33x5 cm	kus	33,000	179,71	5 930,43	0,000	179,71	0,00	-33,00	179,71	-5 930,43
57	899203111	Osazení mříží litinových včetně ramu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	33,000	166,77	5 503,41	32,000	166,77	5 336,64	-1,00	166,77	-166,77
58	592238741	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	33,000	518,81	17 120,73	32,000	518,81	16 601,92	-1,00	518,81	-518,81
59	592238783	mříž litinová pro uliční vpust D400, 500/500 mm	kus	33,000	1863,43	61 493,19	32,000	1863,43	59 629,76	-1,00	1863,43	-1 863,43
60	899203211	Demontáž mříží litinových včetně ramu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	33,000	166,77	5 503,41	32,000	166,77	5 336,64	-1,00	166,77	-166,77
63	935114123	Ostatní konstrukce a práce - bourání	m	135,000	388,700	158 961,69	136,50	388,700	54 422,55	1,50	388,70	598,05
65	592216451	Montáž stěbinového odvodňovacího betonového žlabu 450x500 mm bez vnitřního spádu do lože z betonu C 25/25 XF3	kus	5,000	7369,23	36 846,15	10,000	7369,23	73 692,30	5,00	7369,23	36 846,15
74	998275101	Šterbinový odvodňovací žlab světlostí 20x30 cm, vpustový komplet základní (pero, drážka), 40/45 x 50 x 100 cm	t	133,003	10,70	1 423,13	0,000	10,70	0,00	-133,00	10,70	-1 423,13
75	871350420	Přesun hmot	m	0,000	0,00	0,00	208,986	119,00	24 869,33	208,99	119,00	24 869,33
76	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	0,000	0,00	0,00	82,219	145,00	11 921,76	82,22	145,00	11 921,76
77	871370420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	0,000	0,00	0,00	132,142	177,00	23 389,13	132,14	177,00	23 389,13
78	8773704201	Montáž odboček na potrubí z PP trub žebrováných DN 300	kus	0,000	0,00	0,00	15,000	591,00	8 865,00	15,00	591,00	8 865,00
79	592238505 1	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a DN 200 45x33x5 cm	kus	0,000	0,00	0,00	33,000	179,71	5 930,43	33,00	179,71	5 930,43
80	286147200	trouba kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	0,000	0,00	0,00	16,000	1115,00	17 840,00	16,00	1 115,00	17 840,00
81	286147260	trouba kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	kus	0,000	0,00	0,00	16,000	3755,00	60 080,00	16,00	3 755,00	60 080,00
82	286147240	trouba kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	1730,00	3 460,00	2,00	1 730,00	3 460,00
83	286147210	trouba kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 3m	kus	0,000	0,00	0,00	4,000	1570,00	6 280,00	4,00	1 570,00	6 280,00
84	286147220	trouba kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	0,000	0,00	0,00	33,000	2450,00	80 850,00	33,00	2 450,00	80 850,00
85	286147280	trouba kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	kus	0,000	0,00	0,00	3,000	2195,00	6 585,00	3,00	2 195,00	6 585,00
86	286147300	trouba kanalizační žebrovaná UL TRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	0,000	0,00	0,00	26,000	4845,00	125 970,00	26,00	4 845,00	125 970,00
87	286154140	koleno UL TRA RIB UR-2 DIN 200/45°	kus	0,000	0,00	0,00	13,000	265,00	3 445,00	13,00	265,00	3 445,00
88	2861151202	redukce kanalizace plastové KGB 110/200	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	407,10	2 035,50	5,00	407,10	2 035,50
89	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 110x87°	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	52,00	260,00	5,00	52,00	260,00
90	2861547202	odbočka žebrovaná 45° 300/200 mm	kus	0,000	0,00	0,00	13,000	1630,00	21 190,00	13,00	1 630,00	21 190,00

91	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenná	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	11100,00	55 500,00	5,00	11 100,00	55 500,00
92	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	7310,00	36 550,00	5,00	7 310,00	36 550,00
93	592243070	Šachtová skruž 100/100	kus	0,000	0,00	0,00	10,000	2090,00	20 900,00	10,00	2 090,00	20 900,00
94	592243120	korpus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/59/12 KPS 100x62 5x58 cm	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	1930,00	9 650,00	5,00	1 930,00	9 650,00
95	592243230	Vyrovňovací prstenec 63/10	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	225,00	1 125,00	5,00	225,00	1 125,00
96	899311112	Osazení poklopu s rámem	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	319,00	1 595,00	5,00	319,00	1 595,00
97	55241014	Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání, samonivelační s PUR vložkou	kus	0,000	0,00	0,00	5,000	3072,00	15 360,00	5,00	3 072,00	15 360,00
98	894811267 R1	Revizní šachta R1	kus	0,000	0,00	0,00	1,000	13919,06	13 919,06	1,00	13 919,06	13 919,06
99	894811267 R2	Revizní šachta R2	kus	0,000	0,00	0,00	1,000	8193,09	8 193,09	1,00	8 193,09	8 193,09
		Ostatní konstrukce a práce - bourání										
100	935632311	Odvodňovací plastový žlab pro zařízení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mřístkovým z Pz oceli	m	0,000	0,00	0,00	30,300	620,00	18 786,00	30,30	620,00	18 786,00
101	59227100	žlab odvodňovací FASERFIX KS 100, typ 01, 100x16x16 cm, bez spádu dna	kus	0,000	0,000	0,00	30,000	1 426,00	42 780,00	30,00	1 426,00	42 780,00
102	592 27186	příslušenství FASERFIX KS 100 - vpust odtoková, s plastovým košem, 50x16x50 cm	kus	0,000	0,000	0,00	1,000	3 380,00	3 380,00	1,00	3 380,00	3 380,00
103	59227146	knoflíčkový litinový, tř. C250 FASERFIX KS 100, šlábina 14 mm, úprava KTL, 50x14,9x2 cm	kus	0,000	0,000	0,00	30,000	623,00	18 690,00	30,00	623,00	18 690,00
		Přesun hmot										
104	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	0,00	0,00	1,308	823,00	1 076,48	1,31	823,00	1 076,48

		Cena díla bez DPH SoD	1 807 791,04
		DPH 21%	379 636,12
		Cena díla včetně DPH	2 187 427,16
		Cena díla bez DPH ZEVN	2 079 030,61 Rozdíl a odpady bez DPH
		DPH 21%	436 596,43 DPH 21%
		Cena díla včetně DPH	2 515 627,04 Rozdíl včetně DPH

		Zhotovitel/dodavatel:	
		Firma	tum

		Eduard Mach	2 6 -06- 2017
--	--	--------------------	---------------

		Schválí:	
--	--	----------	--

		Ing. Martin Nepřaš	2 6 -06- 2017
--	--	---------------------------	---------------

		Matěj Rýdl	2 6 -06- 2017
--	--	-------------------	---------------

		Ing. Miroslav Káninský	2 6 -06- 2017
--	--	-------------------------------	---------------

MěÚ Kolín
ORRÚP
Ing. Miroslav Káninský
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín

Č.j.: 6136/2017

Vyřizuje: Bc. Luboš Haken
321 737 192

V Kolíně dne: 15.6.2017

Věc: Vyjádření k nutnosti vybudování podružné trasy kanalizace v rámci výstavby dopravního terminálu v Kolíně

V souvislosti s přípravou výstavby dopravního terminálu a s tím související vynucené rekonstrukce vodovodu v ulici Rorejcova a pod Hroby muselo dojít dle dodatečných podmínek provozovatele kanalizace, které nebyly součástí vyjádření ke stavebnímu povolení, k rekonstrukci kanalizačního řádu v ulici Rorejcova a Pod Hroby. Tyto rekonstrukce jsou realizovány jako samostatné investiční akce.

Projekt výstavby dopravního terminálu předpokládal odvodnění dotčené plochy samostatnými přípojkami uličních vpustí a liniových žlabů do stávající kanalizační stoky. Pro dosažení optimálních odtokových poměrů je však toto řešení v případě nového potrubí páteřní stoky značně nevhodné.

Na základě těchto nových a nepředvídatelných skutečností požadujeme vybudovat podružnou trasu odvodnění za účelem napojení nových odvodňovacích prvků plochy autobusového nádraží v etapě výstavby v ulici Rorejcova a pod zastřešeným terminálem v ulici pod Hroby. Toto nové řešení zajistí, že dešťová voda bude bezproblémově sváděna do jednoho uzlu – sběrné šachty v křižovatce ulic Rorecova – Pod Hroby a Dukelských hrdinů. Podružná stoka bude provedena z plastového potrubí PP plné žebro (Ultra-Rib). Z důvodu napojení shodného materiálu doporučujeme zaměnit materiál přípojek z projektované kameniny na plast.

Jako provozovatel potvrzujeme, že je toto řešení z hlediska funkčnosti mnohem efektivnější než původně navržené, které se díky současné situaci a novým faktům neslučuje se záměrem plně účinného odvodnění přestupního terminálu.

VODOS Kolín

Ing. Miroslav Káninský
321 737 192VODOS s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III
tel.: 321 737 171www.vodoskolin.cz

Změnový list č. 3		29.6.2017
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858	

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 801. Vzhledem k architektonickému pojetí stavby byly vybrány architektem města Ing. arch. MgA Davidem Mateáskem stromové mříže z oceli žárově zinkované se stromovou podporou oproti ocelovým bez stromové podpory. Došlo ke snížení množství stromových mříží o jeden kus, který se původně nacházel v zadlážděné ploše, která byla změněna na plochu zelenou. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, paragrafu 222, se předkládaná změna řadí do parametrů odst. 4, tzv. změny de minimis.
Specifikace změny	Změna materiálu a typu stromové mříže (nově mříž se stromovou podporou) . Snížení počtu stromových mříží o jeden kus.
Zdůvodnění změny	Výběr stromových mříží provedl architekt města v konceptu pojetí celé stavby.

Vypracoval :

Ing. Kristýna Havlátová

Datum :

29.6.2017

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podp	datum
Eduard Mach		29 -06- 2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		29 -06- 2017
projektant/AD		
Matěj Rýdl		29 -06- 2017
zadavatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		29 -06- 2017

Změnový list č. 3

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858							Změnový list č. 3					
SO 801 - Sadové úpravy - ulice Rorejcova a Pod Hroby			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
69	919791023	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a volně položeným rámem plochy přes 1 m2	kus	6,00	3 209,13	19 254,78	5,00	3 209,13	16 045,65	-1,00	3 209,13	-3 209,13
70	749101952	Čvercová stromová mříž z šedé litiny s povrchovou úpravou s vnitřním otvorem 600 mm, vnější rozměr 1500 x 1500 mm	kus	6,00	16 045,64	96 273,84	0,00	16 045,64	0,00	-6,00	16 045,64	-96 273,84
NOVÉ POLOŽKY												
72	749101R	Čtvercová stromová mříž s ochranou kmene, ocel žárově zinkovaná, rozměr 1500 x 1500 mm	kus	0,00	0,00	0,00	5,00	21 867,39	109 336,95	5,00	21 867,39	109 336,95

Cena díla bez DPH SoD	661 769,87	
DPH 21%	138 971,67	
Cena díla včetně DPH	800 741,54	
Cena díla bez DPH ZBV1	671 623,85	Rozdíl a odpočty bez DPH
DPH 21%	141 041,01	DPH 21%
Cena díla včetně DPH	812 664,86	Rozdíl včetně DPH
		9 853,98
		2 069,34
		11 923,32

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Eduard Mach

Datum

Schválil:

IDI

Ing. Martin Nepraš

Datum

Projektant

Matěj Rýdl

Datum

Objednatel

Ing. Miroslav Káninský

Datum

Změnový list č. 4		29.6.2017
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858	

Popis změny	Předkládaná změna se týká stavebního objektu SO 802. Vzhledem k architektonickému pojetí stavby byly vybrány architektem města Ing. arch. MgA Davidem Mateáškem stromové mříže z oceli žárově zinkované se stromovou podporou oproti ocelovým bez stromové podpory. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, paragrafu 222, se předkládaná změna řadí do parametrů odst. 4, tzv. změny de minimis.
Specifikace změny	Změna materiálu a typu stromové mříže (nově mříž se stromovou podporou) .
Zdůvodnění změny	Výběr stromových mříží provedl architekt města v konceptu pojetí celé stavby.

Vypracoval :

Ing. Kristýna Havlátová

Datum :

29.6.2017

Zhotovitel/dodavatel:

jméno		datum
Eduard Mach		29 -06- 2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Martin Nepraš		29 -06- 2017
projektant/AD		
Matěj Rýdl		29 -06- 2017
zadavatel/objednatel		
Ing. Miroslav Káninský		29 -06- 2017

Změnový list č. 4

Název stavby: Modernizace přestupního terminálu v Kolíně CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001858							Změnový list č. 4						
SO 802 - Sadové úpravy - ulice Dukelských Hrdinů, parkoviště, odstavná plocha BUS			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
75	749101952	Čtvercová stromová mříž z šedé litiny s povrchovou úpravou s vnitřním otvorem 600 mm, vnější rozměr 1500 x 1500 mm	kus	8,00		16 045,64	128 365,12	0,00	16 045,64	0,00	-8,00	16 045,64	-128 365,12
		NOVÉ POLOŽKY											
77	749101R	Čtvercová stromová mříž s ochranou kmene, ocel žárově zinkovaná, rozměr 1500 x 1500 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	21 867,39	174 939,12	8,00	21 867,39	174 939,12

	Cena díla bez DPH SoD	1 906 175,07		
	DPH 21%	400 296,76		
	Cena díla včetně DPH	2 306 471,83		
	Cena díla bez DPH ZBV1	1 952 749,07	Rozdíl a odpočty bez DPH	46 574,00
	DPH 21%	410 077,30	DPH 21%	9 780,54
	Cena díla včetně DPH	2 362 826,37	Rozdíl včetně DPH	56 354,54

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Eduard Mach

Schválil:

TDI

Ing. Martin Nepraš

Projektant

Matěj Rýdl

Objednatel

Ing. Miroslav Káninský



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974, bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.



Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.


Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 07.12.2016

člen představenstva
STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:Ing.
e.....
jméno, příj.....
jméno, příjmení, funkce, podpis
